Lavorazione	Durata	Data inizio	Data fine	Impresa	Tot. Ug
1 - Elenco Lavori	228,00	03 02 14 00:00:00	18 12 14 00:00:00		0,00
1 . 1 - Demolizione totale o parziale di ...	1,00	18 02 14 00:00:00	19 02 14 00:00:00	EDILE	2,00
1 . 2 - Spicconatura parziale dell'intona...	7,00	04 03 14 00:00:00	13 03 14 00:00:00	EDILE	14,00
1 . 3 - Rimozione di serramenti interni	7,00	20 02 14 00:00:00	01 03 14 00:00:00	EDILE	14,00
1 . 4 - Rimozionew di pereti attrezzate ...	10,00	10 02 14 00:00:00	22 02 14 00:00:00	EDILE	20,00
1 . 5 - Demolizione di pavimenti, sottof...	10,00	17 03 14 00:00:00	29 03 14 00:00:00	EDILE	30,00
1 . 6 - Rimozione di reti di tubazioni di c...	5,00	24 03 14 00:00:00	29 03 14 00:00:00		10,00
1 . 7 - Rimozione di condizionatori mon...	2,00	10 02 14 00:00:00	12 02 14 00:00:00	EDILE	4,00
1 . 8 - Murature e tramezzature in matt...	14,00	31 03 14 00:00:00	18 04 14 00:00:00	EDILE	28,00
1 . 9 - Muraure di tamponamento spess...	13,00	09 04 14 00:00:00	26 04 14 00:00:00	EDILE	52,00
1 . 10 - Parete in pannelli di cartongess...	7,00	05 05 14 00:00:00	14 05 14 00:00:00	EDILE	14,00
1 . 11 - Controparete in pannelli di carto...	5,00	12 05 14 00:00:00	17 05 14 00:00:00	EDILE	10,00
1 . 12 - Lisciatura autolivellante per inte...	3,00	30 04 14 00:00:00	03 05 14 00:00:00	EDILE	6,00
1 . 13 - Esecuzione di massetto (zona b...	5,00	28 04 14 00:00:00	03 05 14 00:00:00	EDILE	10,00
1 . 14 - Esecuzione intonaco civile	8,00	19 05 14 00:00:00	29 05 14 00:00:00	EDILE	24,00
1 . 15 - Pavimento in vinilico antistatico	10,00	30 05 14 00:00:00	13 06 14 00:00:00	EDILE	40,00
1 . 16 - Fornitura e posa in opera di zoc...	5,00	16 06 14 00:00:00	21 06 14 00:00:00	EDILE	10,00
1 . 17 - Pavimenti e rivestimenti in cera...	5,00	23 06 14 00:00:00	28 06 14 00:00:00	EDILE	10,00
1 . 18 - Rigenerazione controtelai	3,00	30 06 14 00:00:00	03 07 14 00:00:00	EDILE	6,00
1 . 19 - Prove di tenuta e di isolamento ...	7,00	04 07 14 00:00:00	15 07 14 00:00:00	EDILE	14,00
1 . 20 - Coibentazione interna dei casso...	10,00	07 07 14 00:00:00	19 07 14 00:00:00	EDILE	20,00
1 . 21 - Pannelli di chiusura cassonetti	5,00	14 07 14 00:00:00	19 07 14 00:00:00	EDILE	10,00
1 . 22 - Fornitura e posa in opera di port...	2,00	16 12 14 00:00:00	18 12 14 00:00:00	EDILE	4,00
1 . 23 - Fornitura e posa in opera di port...	2,00	16 12 14 00:00:00	18 12 14 00:00:00		4,00
1 . 25 - Fornitura e posa in opera di cas...	8,00	22 07 14 00:00:00	01 08 14 00:00:00	EDILE	16,00
1 . 26 - Stuccatura totale di superfici int...	8,00	24 11 14 00:00:00	04 12 14 00:00:00	EDILE	16,00
1 . 24 - Fornitura e posa in opera di infis...	25,00	22 09 14 00:00:00	25 10 14 00:00:00		0,00
1 . 27 - Tinteggiatura a tempera su soffi...	10,00	01 12 14 00:00:00	13 12 14 00:00:00	EDILE	20,00
1 . 28 - Tinteggiatura con pittura lavabile	5,00	08 12 14 00:00:00	13 12 14 00:00:00		20,00
1 . 29 - Applicazione di rivestimento pla...	5,00	04 12 14 00:00:00	11 12 14 00:00:00	EDILE	10,00
1 . 30 - Verniciatura tubazioni idriche an...	5,00	24 11 14 00:00:00	29 11 14 00:00:00	EDILE	5,00
1 . 31 - Fornitura e posa in opera di con...	10,00	18 08 14 00:00:00	30 08 14 00:00:00	EDILE	30,00
1 . 32 - Finte travi in pannello di cartong...	5,00	11 08 14 00:00:00	16 08 14 00:00:00	EDILE	10,00
1 . 33 - Velette in pannelli di cartongesso	5,00	11 08 14 00:00:00	16 08 14 00:00:00	EDILE	10,00
1 . 34 - Realizzazione di gruppo bagni i...	5,00	04 08 14 00:00:00	09 08 14 00:00:00	EDILE	10,00
1 . 35 - Pilozzo in porcellana vetrificata	2,00	07 08 14 00:00:00	09 08 14 00:00:00	EDILE	4,00
1 . 36 - Adeguamento impianto idrico a...	5,00	01 09 14 00:00:00	06 09 14 00:00:00	EDILE	10,00
1 . 37 - Fornitura e posa in opera di impi...	5,00	08 09 14 00:00:00	13 09 14 00:00:00	EDILE	10,00
1 . 38 - Fornitura e posa in opera di impi...	5,00	15 09 14 00:00:00	20 09 14 00:00:00	EDILE	10,00
1 . 39 - Rimozione di tutti gli organi illumi...	10,00	24 02 14 00:00:00	08 03 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	20,00
1 . 64 - Revisione impianto di gestione ...	5,00	10 11 14 00:00:00	15 11 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	10,00
1 . 78 - Posa in opera di estintore a pol...	2,00	03 02 14 00:00:00	05 02 14 00:00:00	EDILE	0,00
1 . 40 - Scollegamento del quadro elettr...	2,00	24 02 14 00:00:00	26 02 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	4,00
1 . 41 - Migrazione apparati al nuovo ar...	3,00	19 11 14 00:00:00	22 11 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	6,00
1 . 42 - Fornitura e posa in opera di app...	7,00	03 11 14 00:00:00	12 11 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	14,00
1 . 43 - Fornitura e posa in opera di app...	10,00	20 10 14 00:00:00	01 11 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	20,00
1 . 44 - Fornitura e posa in opera di app...	10,00	10 11 14 00:00:00	22 11 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	20,00
1 . 45 - Fornitura e posa in opera di plaf...	5,00	27 10 14 00:00:00	01 11 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	10,00
1 . 46 - Realizzazione di punti luce a de...	5,00	06 10 14 00:00:00	11 10 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	10,00
1 . 47 - Realizzazione di punti luce a pu...	5,00	13 10 14 00:00:00	18 10 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	10,00
1 . 48 - Realizzazione di punto luce in v...	5,00	13 10 14 00:00:00	18 10 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	10,00
1 . 49 - Realizzazione di punti luce a int...	7,00	09 10 14 00:00:00	18 10 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	14,00
1 . 50 - Realizzazione di punti luce a int...	8,00	06 10 14 00:00:00	16 10 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	16,00
1 . 51 - Realizzazione di punto luce con...	6,00	09 10 14 00:00:00	17 10 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	12,00
1 . 52 - Realizzazione di punti luce in vi...	5,00	06 10 14 00:00:00	11 10 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	10,00
1 . 53 - Realizzazione di punti luce in vi...	3,00	17 10 14 00:00:00	22 10 14 00:00:00		6,00
1 . 54 - Fornitura e posa in opera di plaf...	5,00	20 10 14 00:00:00	25 10 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	10,00
1 . 55 - Fornitura e posa in opera di plaf...	3,50	23 10 14 00:00:00	28 10 14 12:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	7,00
1 . 56 - Realizzazione di linee elettriche	5,00	29 09 14 00:00:00	04 10 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	20,00
1 . 57 - Fornitura e posa in opera di can...	5,00	22 09 14 00:00:00	27 09 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	15,00
1 . 58 - Fornitura e posa in opera di micr...	5,00	22 09 14 00:00:00	27 09 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	10,00
1 . 59 - Fornitura a posa in opera di pun...	7,00	20 10 14 00:00:00	29 10 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	14,00
1 . 60 - Interventi per l'attivazione dell'ar...	5,00	27 10 14 00:00:00	01 11 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	10,00
1 . 61 - Realizzazione di impianto elettri...	1,00	24 11 14 00:00:00	25 11 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	2,00
1 . 62 - Realizzazione di impianto di seg...	5,00	03 11 14 00:00:00	08 11 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	10,00
1 . 63 - Realizzazione di linee elettriche	5,00	02 10 14 00:00:00	09 10 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	10,00
1 . 65 - Opere di bonifica vano tecnico...	2,00	17 11 14 00:00:00	19 11 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	4,00
1 . 66 - Revisione impianto sonoro di all...	3,00	19 11 14 00:00:00	22 11 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	6,00
1 . 67 - Fornitura e posa in opera di unit...	2,00	24 11 14 00:00:00	26 11 14 00:00:00	IMPIANTI TERMICI	8,00
1 . 68 - Fornitura e posa in opera di n. 3...	9,00	04 12 14 00:00:00	17 12 14 00:00:00	IMPIANTI TERMICI	18,00
1 . 69 - Fornitura e posa in opera di n. 2...	1,00	17 12 14 00:00:00	18 12 14 00:00:00	IMPIANTI TERMICI	2,00
1 . 70 - Fornitura e posa in opera di n. 2...	2,00	16 12 14 00:00:00	18 12 14 00:00:00	IMPIANTI TERMICI	4,00
1 . 71 - Realizzazione di circuito frigorife...	5,00	01 12 14 00:00:00	06 12 14 00:00:00	IMPIANTI TERMICI	15,00
1 . 72 - Realizzazione di linea BUS di c...	5,00	01 12 14 00:00:00	06 12 14 00:00:00	IMPIANTI TERMICI	15,00
1 . 73 - Fornitura e posa in opera di un ...	2,00	24 11 14 00:00:00	26 11 14 00:00:00		2,00
1 . 74 - Realizzazione, in controsoffitto, ...	5,00	26 11 14 00:00:00	03 12 14 00:00:00	IMPIANTI TERMICI	10,00
1 . 75 - Realizzazione, in controsoffitto, ...	5,00	26 11 14 00:00:00	03 12 14 00:00:00	IMPIANTI TERMICI	10,00
1 . 76 - Realizzazione di impianto scaric...	4,00	28 11 14 00:00:00	04 12 14 00:00:00	IMPIANTI TERMICI	8,00
1 . 77 - Realizzazione di impianto di estr...	4,00	04 12 14 00:00:00	10 12 14 00:00:00	IMPIANTI TERMICI	8,00
1 . 79 - Formazione di recinzione di can...	5,00	03 02 14 00:00:00	08 02 14 00:00:00	EDILE	0,00
1 . 80 - IMPIANTO ELETTRICO E DI T...	5,00	03 02 14 00:00:00	08 02 14 00:00:00	IMPIANTI ELETTRICI	0,00
1 . 81 - PONTI SU RUOTE	149,00	24 02 14 00:00:00	19 09 14 00:00:00	EDILE	0,00
1 . 82 - Posa in opera di ponteggio auto...	152,00	03 02 14 00:00:00	03 09 14 00:00:00	EDILE	0,00
1 . 83 - Valigetta con materiale di pront...	1,50	03 02 14 00:00:00	04 02 14 12:00:00	EDILE	0,00
1 . 84 - Uso dell'autocestello/piattaforma	2,00	24 11 14 00:00:00	26 11 14 00:00:00	EDILE	2,00

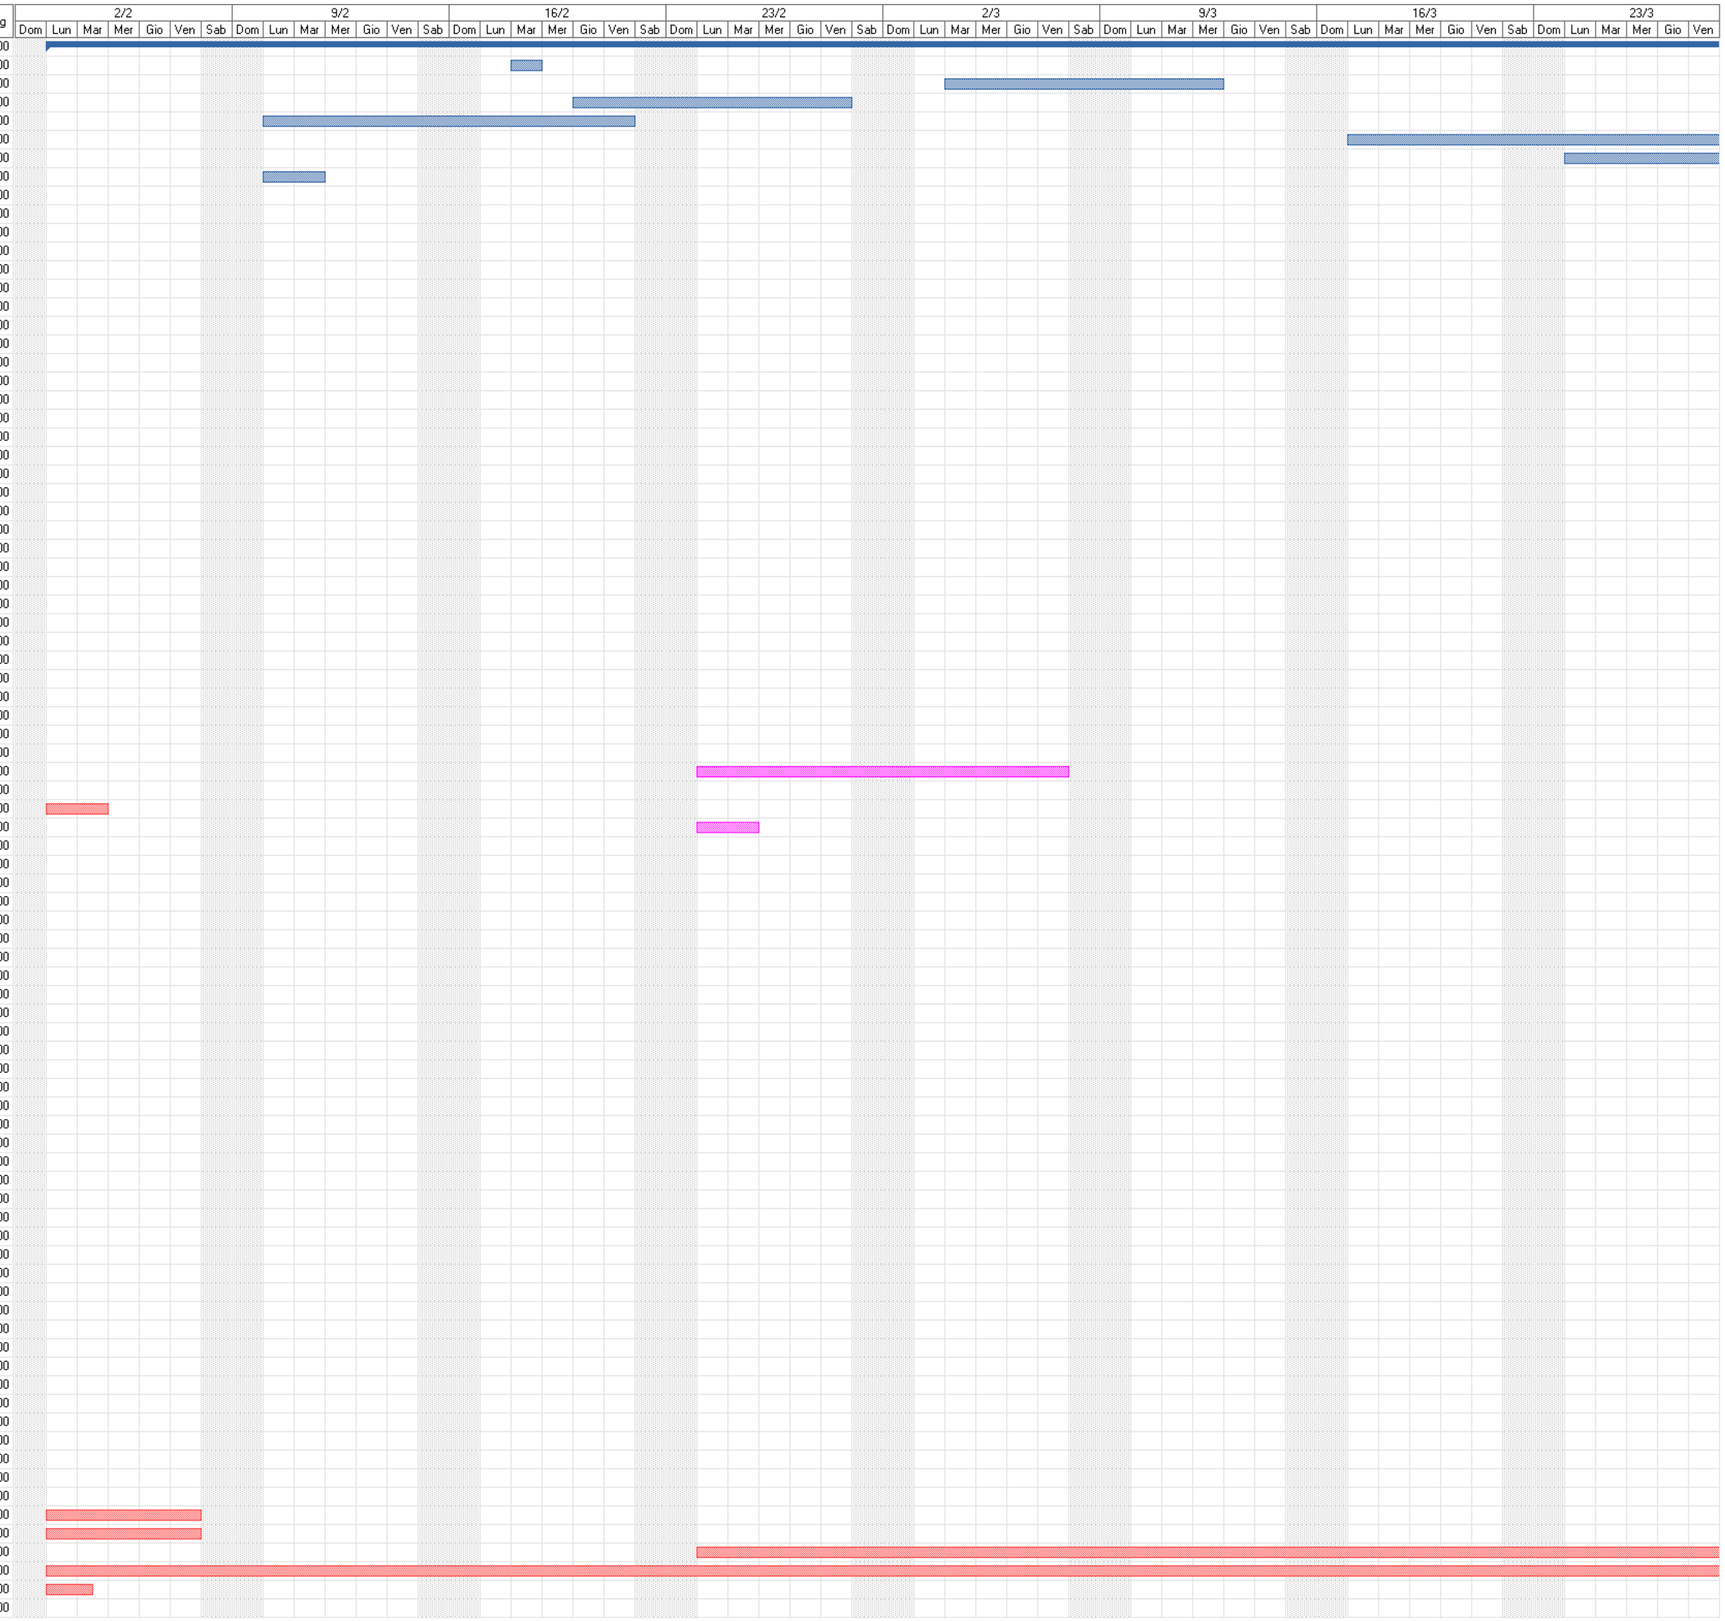

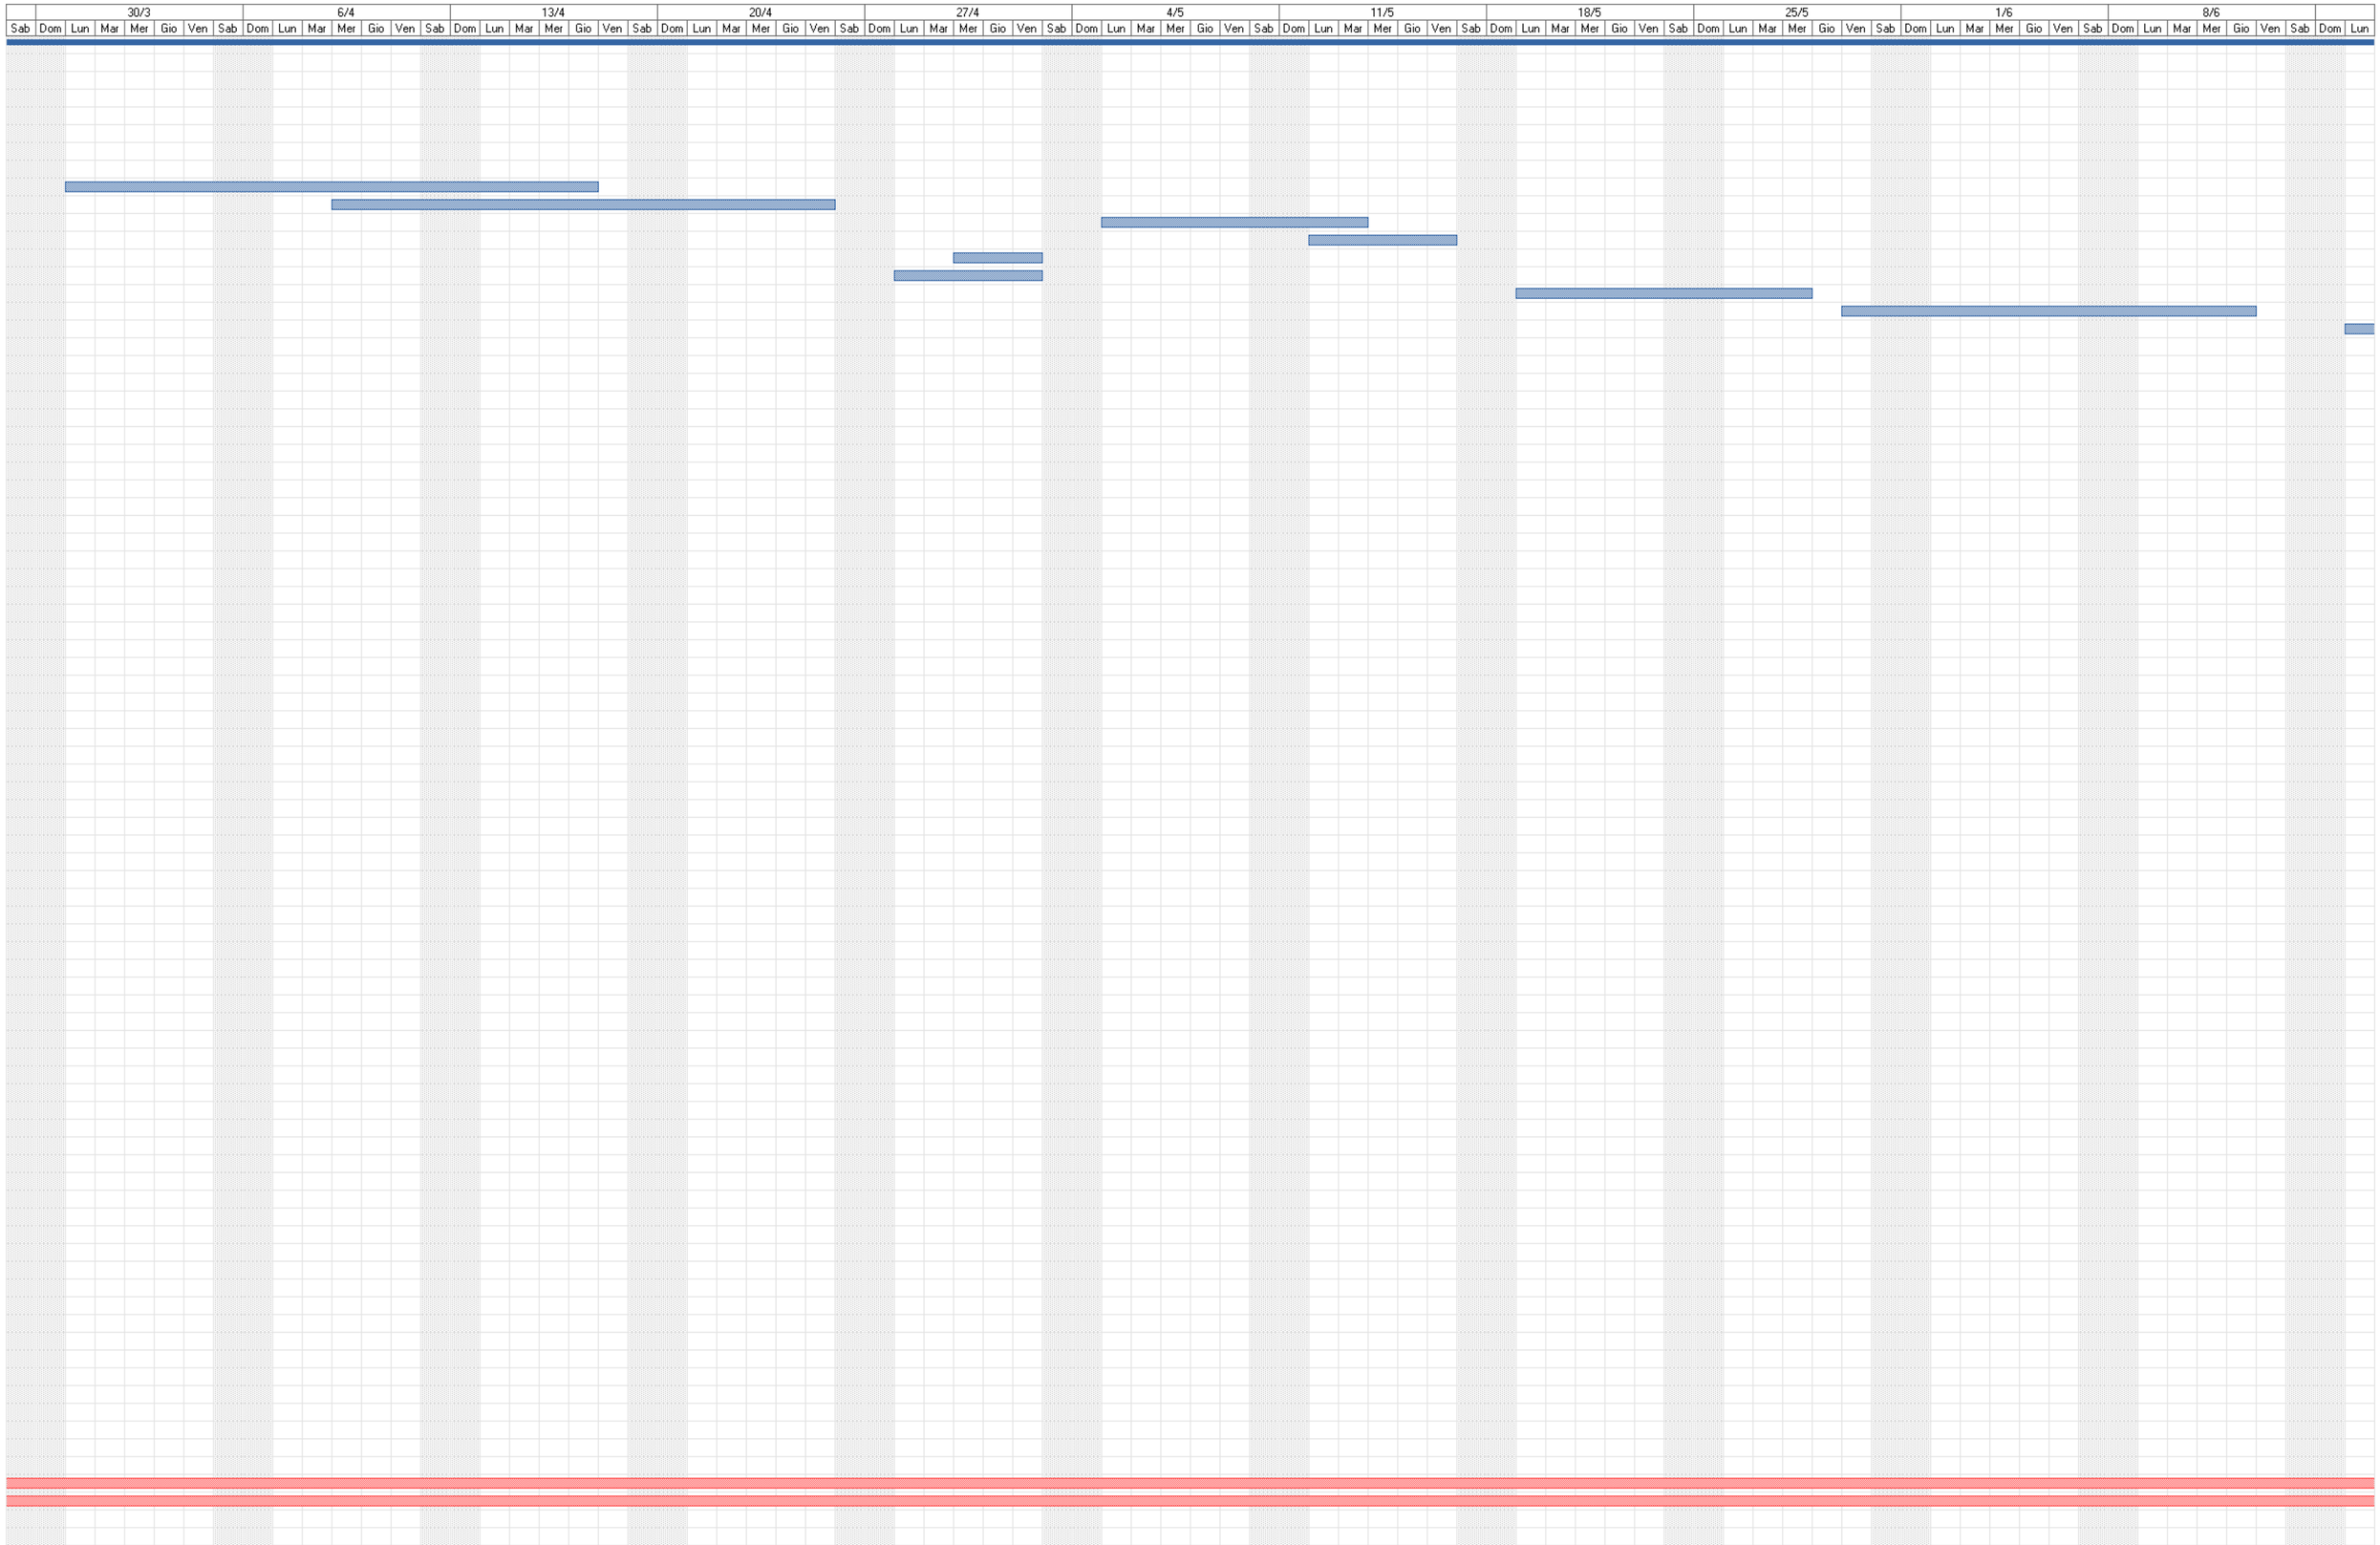
30/3
6/4
13/4
20/4
27/4
4/5
11/5
18/5
25/5
1/6
8/6
Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun

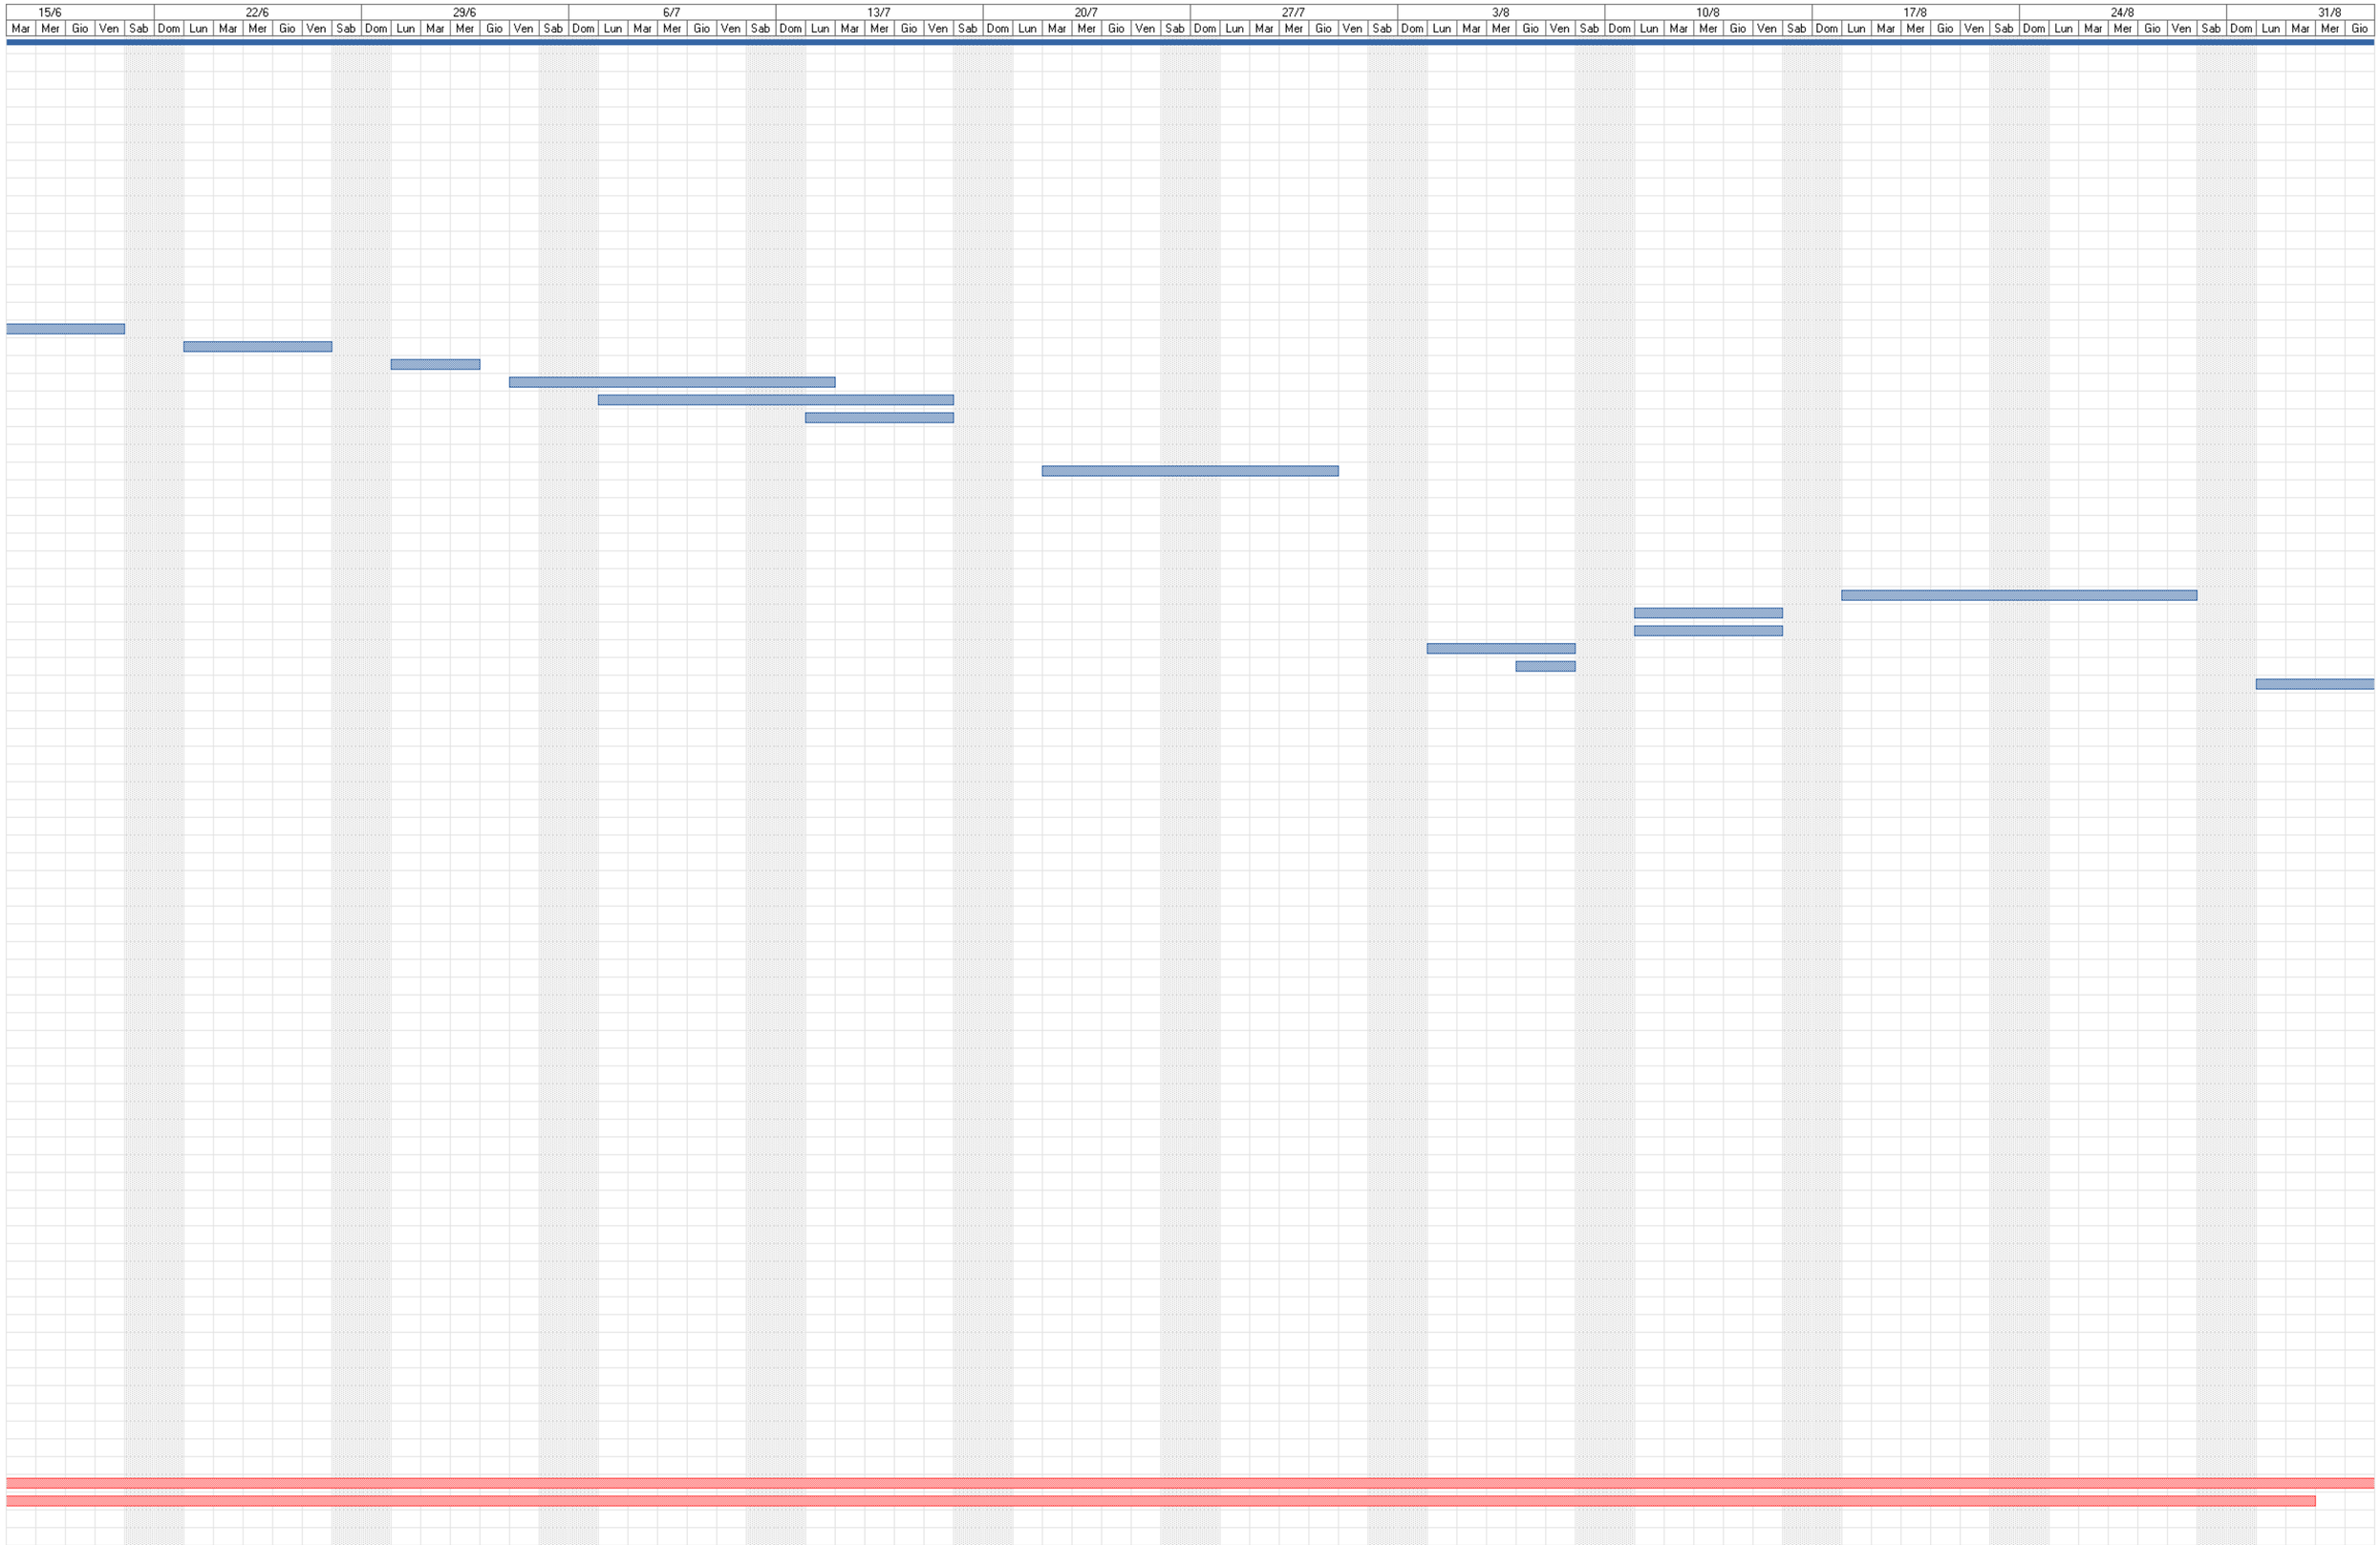
15/6
22/6
29/6
6/7
13/7
20/7
27/7
3/8
10/8
17/8
24/8
31/8
Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio

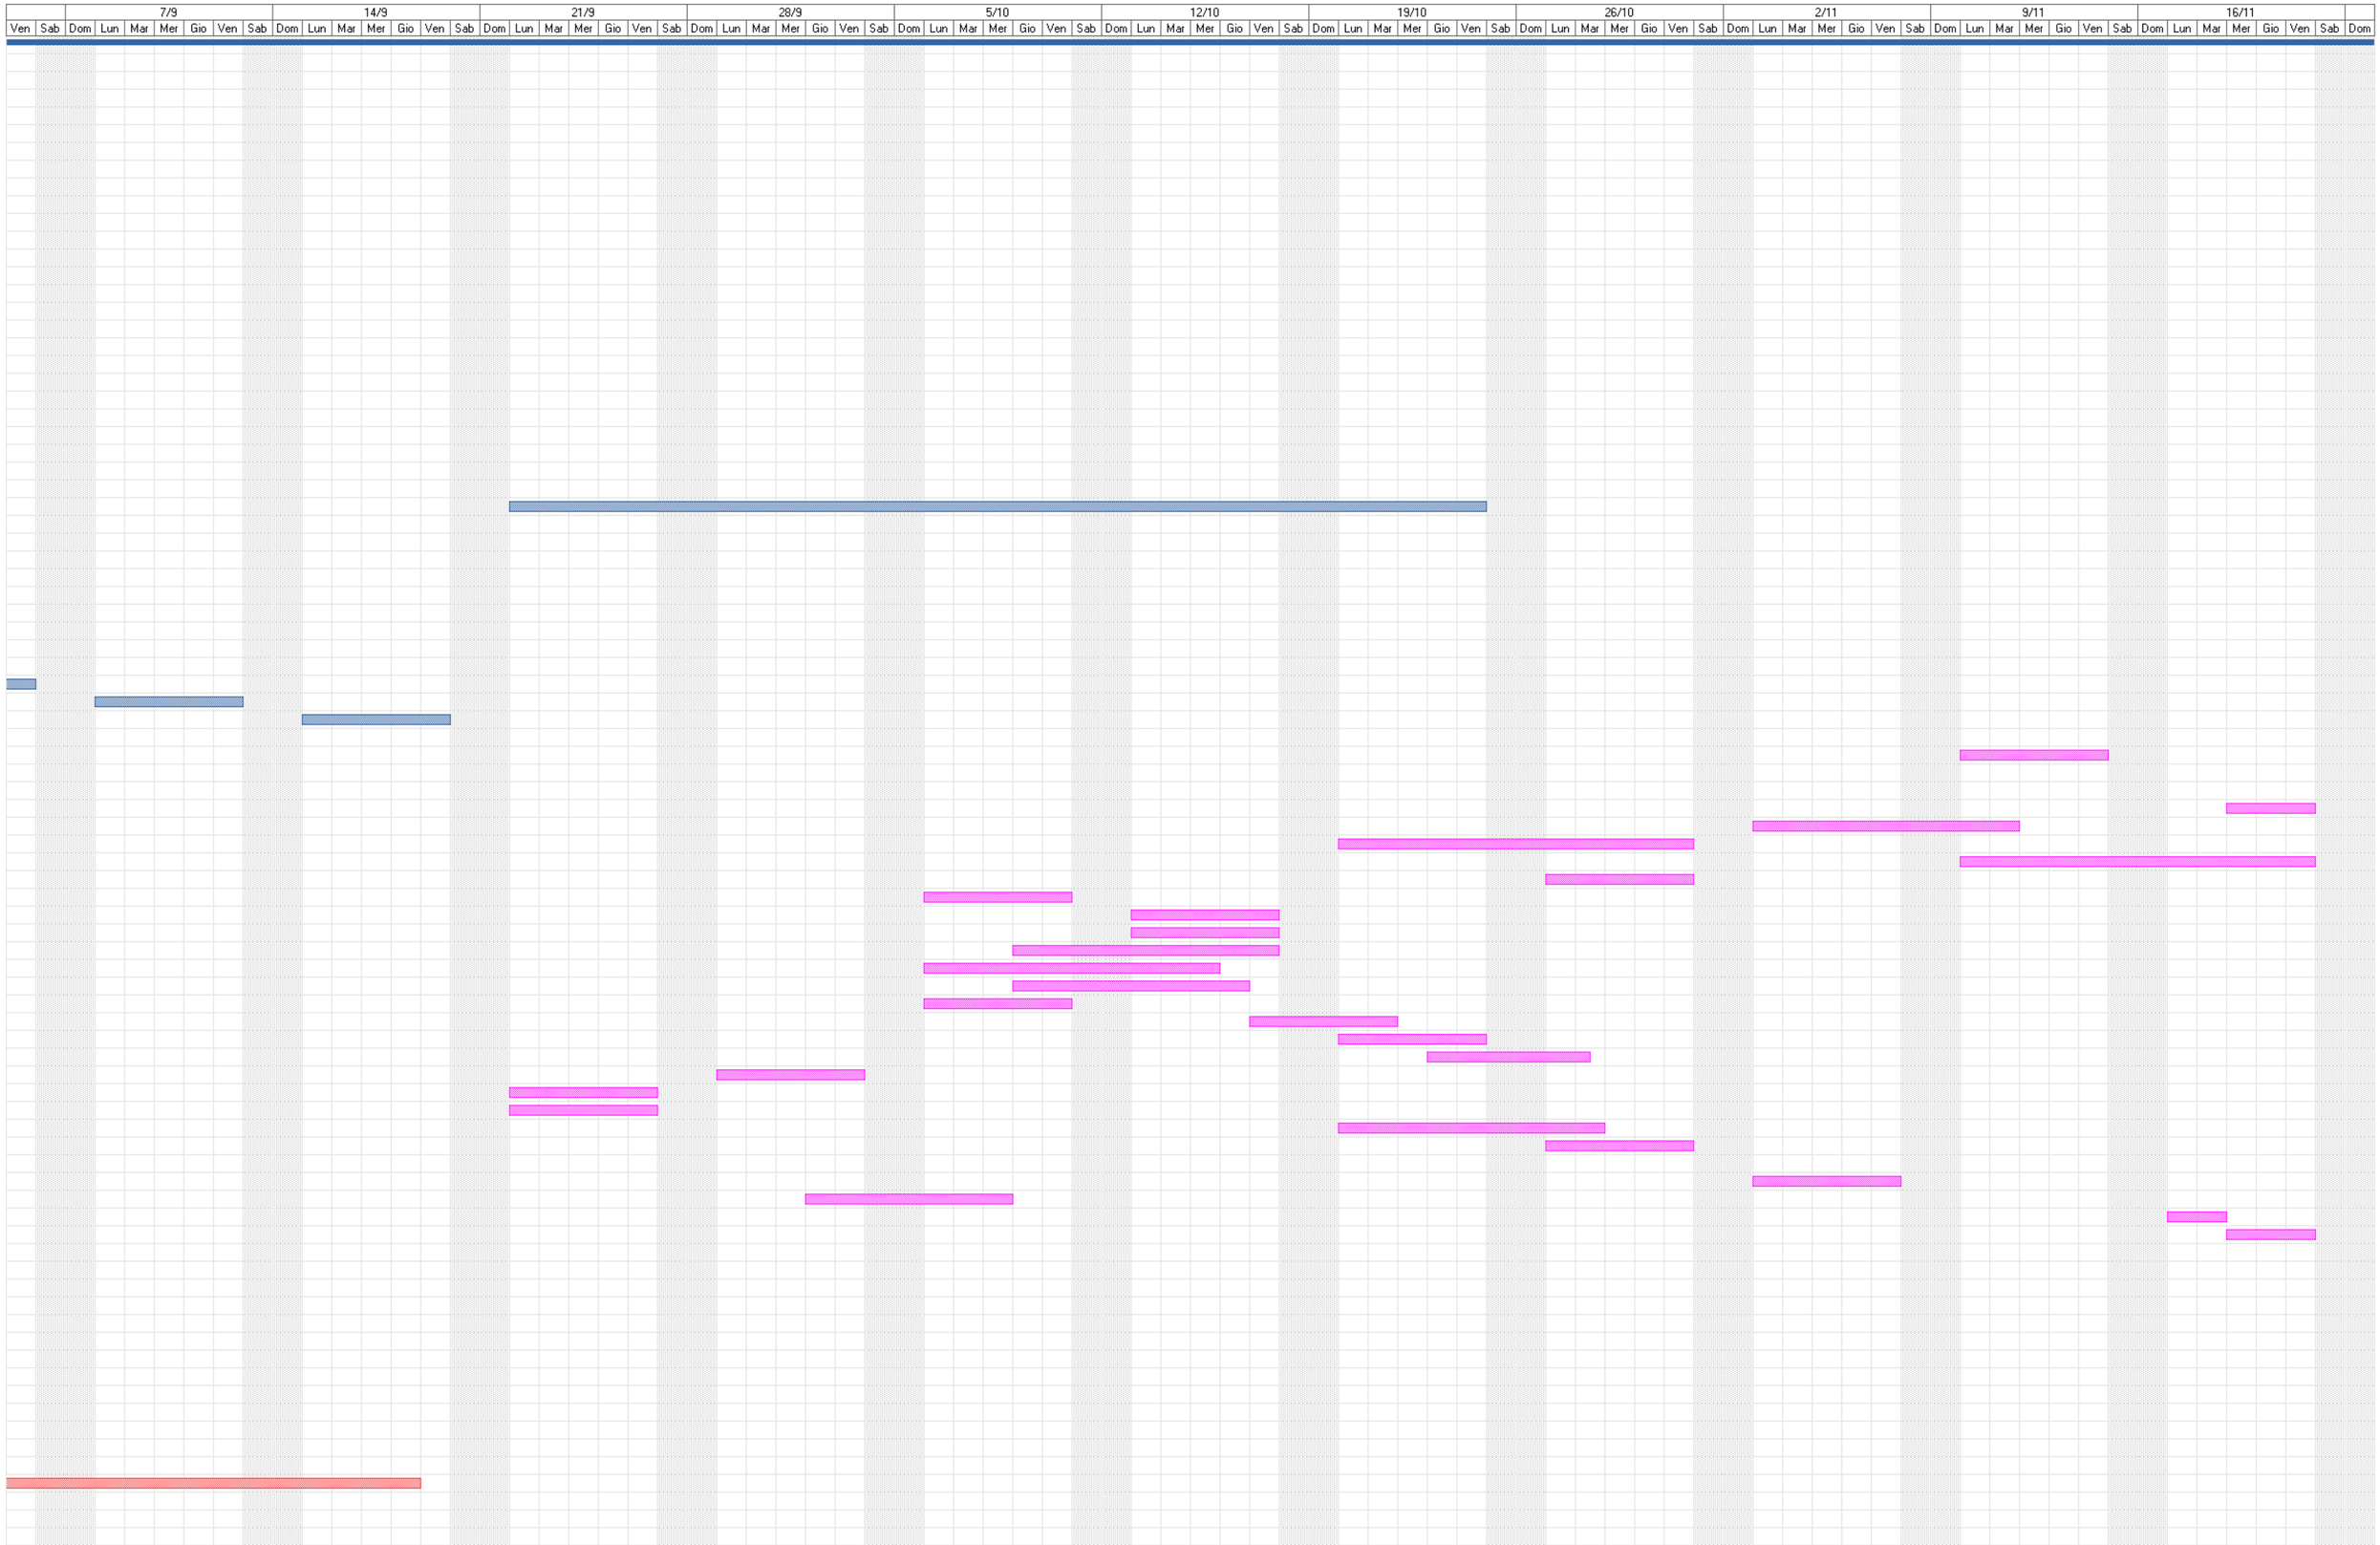
7/9
14/9
21/9
28/9
5/10
12/10
19/10
26/10
2/11
9/11
16/11
Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom

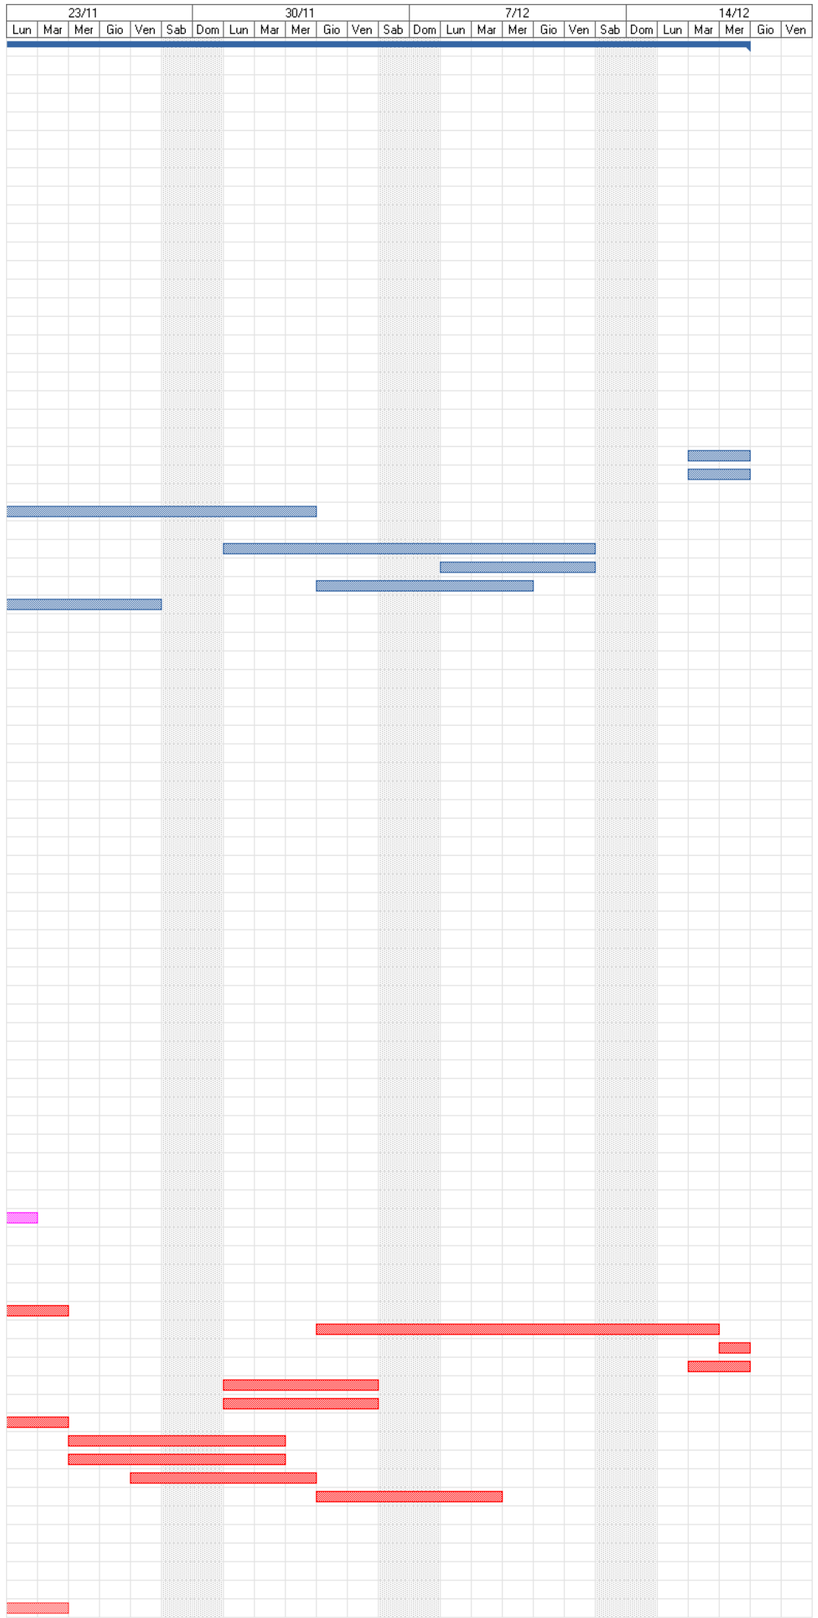
23/11
30/11
7/12
14/12
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Lun Mar Mer Gio Ven
